

TUNEL 2			
Lewy   Left			
	wg. osi tunelu   by axis of the tunnel	Aktualny   Actual	
Drażenie Drill	km 723 477	1584,41 [m b.] [lm]	82,42 %
Spąg Invert	km 723 359	1466,61 [m b.] [lm]	76,29 %
Kalota* Top crown	km 723 309	1312,90 [m b.] [lm]	68,30 %

\*na odcinku / on section :  
721+892,856 - 721+910,306, 722+812,210 - 722+886,970 oraz 722+927,470 - 722+938,970  
nie ma jeszcze wykonanych kalot / there is no top crowns yet

TUNEL 4			
Lewy   Left			
	wg. osi tunelu   by axis of the tunnel	Aktualny   Actual	
Drażenie Drill	km 723 477	337,95 [m b.] [lm]	17,58 %
Spąg Invert	km 723 359	455,75 [m b.] [lm]	23,71 %
Kalota* Top crown	km 723 692	15,00 [m b.] [lm]	0,78 %


\*na odcinku / on section :  
723+706,510 - 723+815,217  
nie ma jeszcze wykonanych kalot - there is no top crowns yet

TUNEL 2+4			
Lewy   Left			
		Aktualny   Actual	
Drażenie Drill		1922,36 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		1922,36 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		1327,90 [m b.] [lm]	69,08 %

POZOSTAŁO DO WYKONANIA / TO FINISH			
Lewy   Left			
Drażenie Drill		0 [m b.] [lm]	
Spąg Invert		0 [m b.] [lm]	
Kalota Top crown		594 [m b.] [lm]	

Portal N - północny | North

Portal S - południowy | South

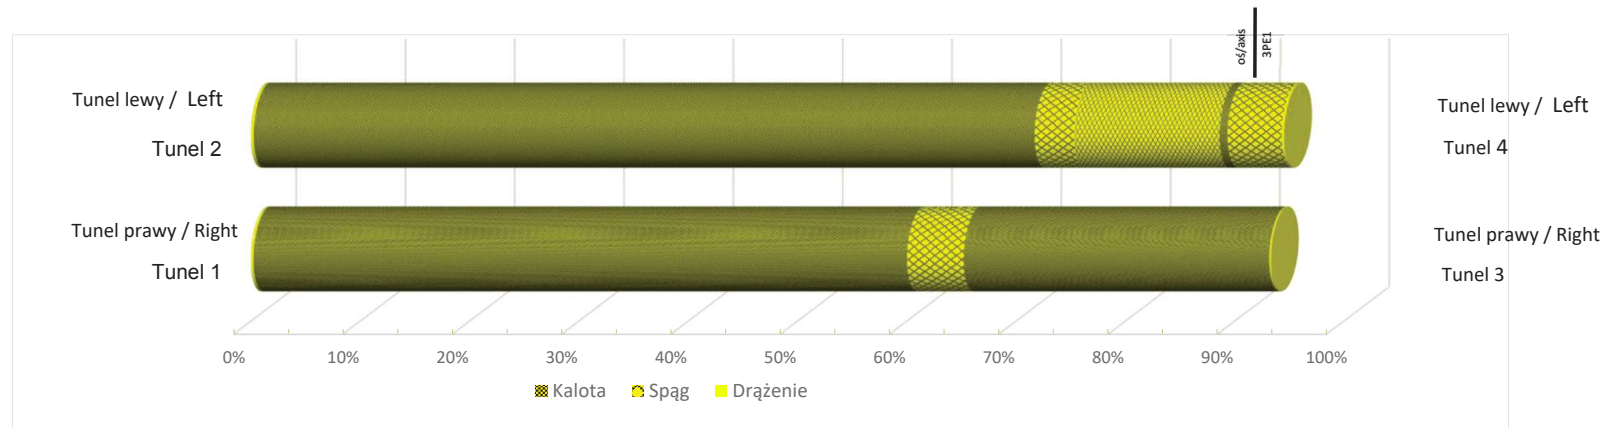

TUNEL Prawy i Lewy			
Prawy i lewy   Right and left			
		Aktualny   Actual	
Drażenie Drill		3839,46 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		3839,46 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		3201,97 [m b.] [lm]	83,40 %

TUNEL 1			
Prawy   Right			
	wg. osi tunelu   by axis of the tunnel	Aktualny   Actual	
Drażenie Drill	km 723 303	1382,90 [m b.] [lm]	72,13 %
Spąg Invert	km 723 237	1317,40 [m b.] [lm]	68,72 %
Kalota Top crown	km 723 249	1329,40 [m b.] [lm]	69,34 %

TUNEL 3			
Prawy   Right			
	wg. osi tunelu   by axis of the tunnel	Aktualny   Actual	
Drażenie Drill	km 723 303	534,20 [m b.] [lm]	27,87 %
Spąg Invert	km 723 237	599,70 [m b.] [lm]	31,28 %
Kalota Top crown	km 723 292	544,67 [m b.] [lm]	28,41 %

TUNEL 1+3			
Prawy   Right			
		Aktualny   Actual	
Drażenie Drill		1917,10 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		1917,10 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		1874,07 [m b.] [lm]	97,76 %

POZOSTAŁO DO WYKONANIA / TO FINISH			
Prawy   Right			
Drażenie Drill		0 [m b.] [lm]	
Spąg Invert		0 [m b.] [lm]	
Kalota Top crown		43 [m b.] [lm]	
