

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

14-02-2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
ROAD SLAB			0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA	[mb] [lm]
ROAD SLAB	

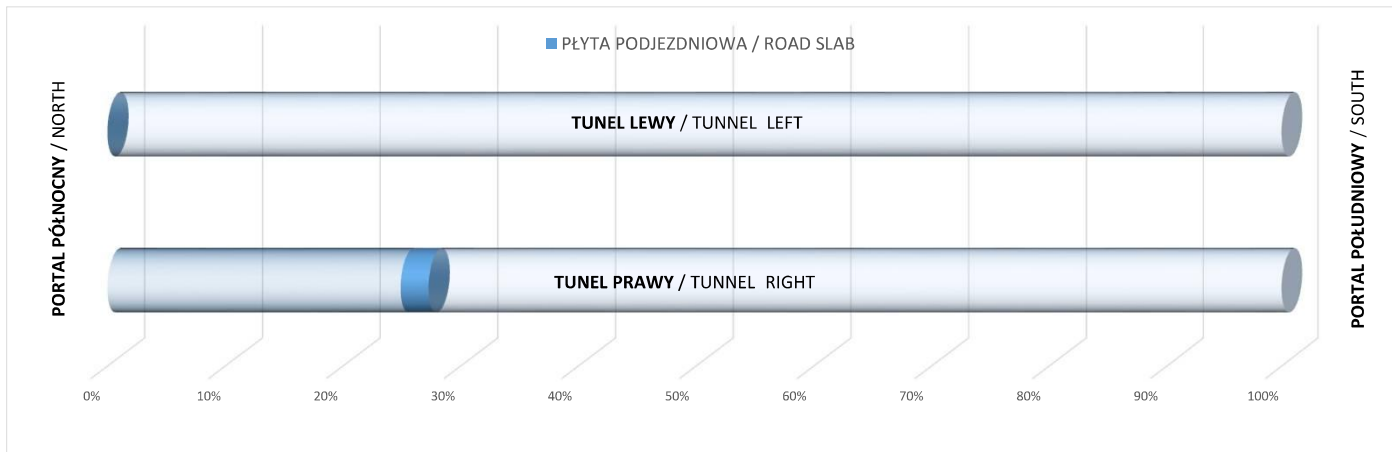

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA	48,40 [mb] [lm]
ROAD SLAB	1,2 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	722 401,25	48,40 [mb] [lm]
ROAD SLAB			2,4 [%]

od/from km 722 352,85

PŁYTA PODJEZDNIOWA	1 993,44 [mb] [lm]
ROAD SLAB	
