

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

07-03-2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
ROAD SLAB			0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA	[mb] [lm]
ROAD SLAB	

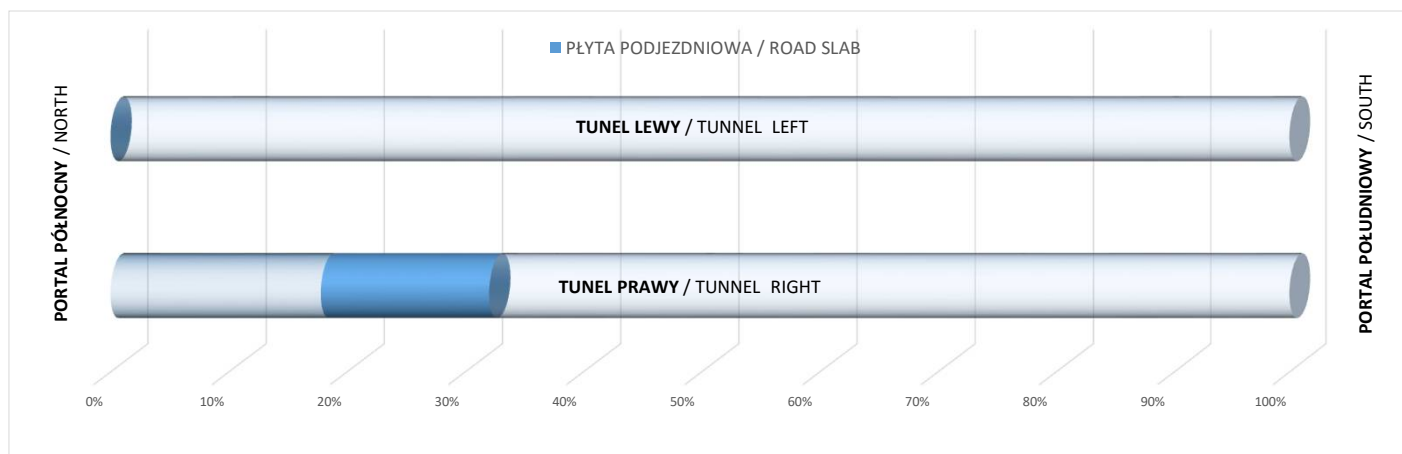

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA		290,80 [mb] [lm]
ROAD SLAB		7,1 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km	722 498,35	290,80 [mb] [lm]
ROAD SLAB			14,2 [%]
od/from km		722 207,55	

PŁYTA PODJEZDNIOWA	1 751,04 [mb] [lm]
ROAD SLAB	
