

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

14-03-2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km 721 818,46	0,00 [mb] [lm]
ROAD SLAB		0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA	[mb]
ROAD SLAB	[lm]

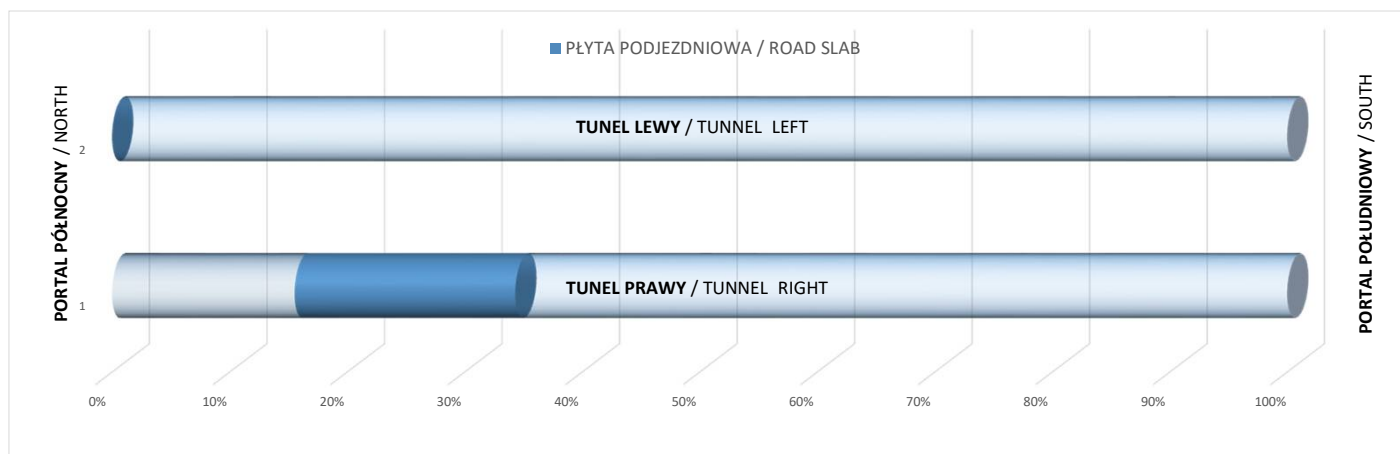

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	383,30 [mb] [lm]
ROAD SLAB	9,4 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA	km 722 544,55	383,30 [mb] [lm]
ROAD SLAB		18,8 [%]

od/from km 722 161,25

PŁYTA PODJEZDNIOWA	1 658,54 [mb] [lm]
ROAD SLAB	
