

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

28.03.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]	0 [%]	
	end km				

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	[mb] [lm]
---------------------------------	--------------

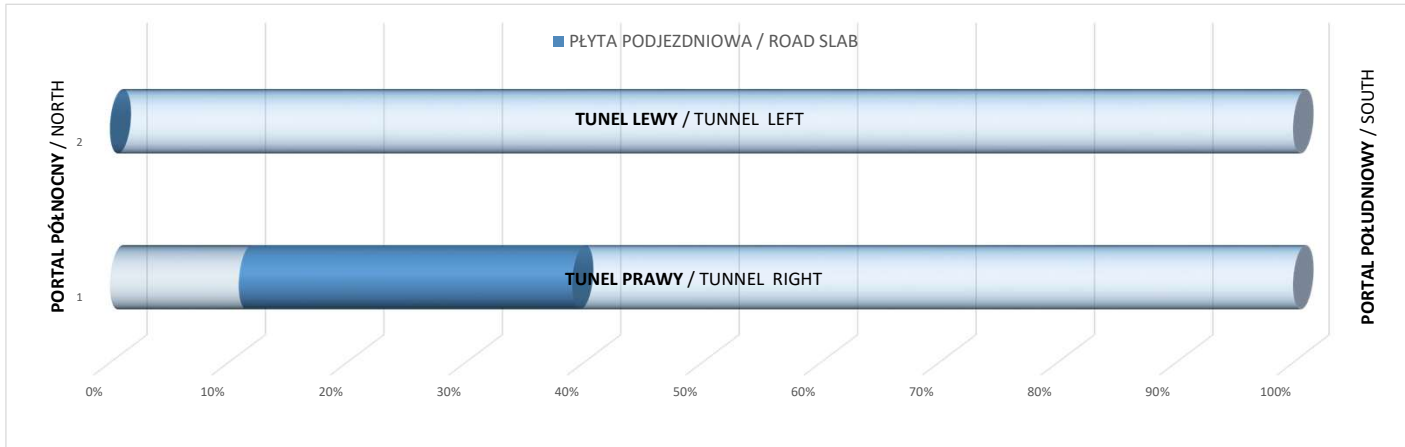

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB		575,00 [mb] [lm]	14,1 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 066,25	575,00 [mb] [lm]	28,2 [%]	
	end km	722 641,25			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 466,84 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
