

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

02.04.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 373,35	29,50 [mb] [lm]	1,4 [%]	
	end km	722 402,85			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	2 016,43 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

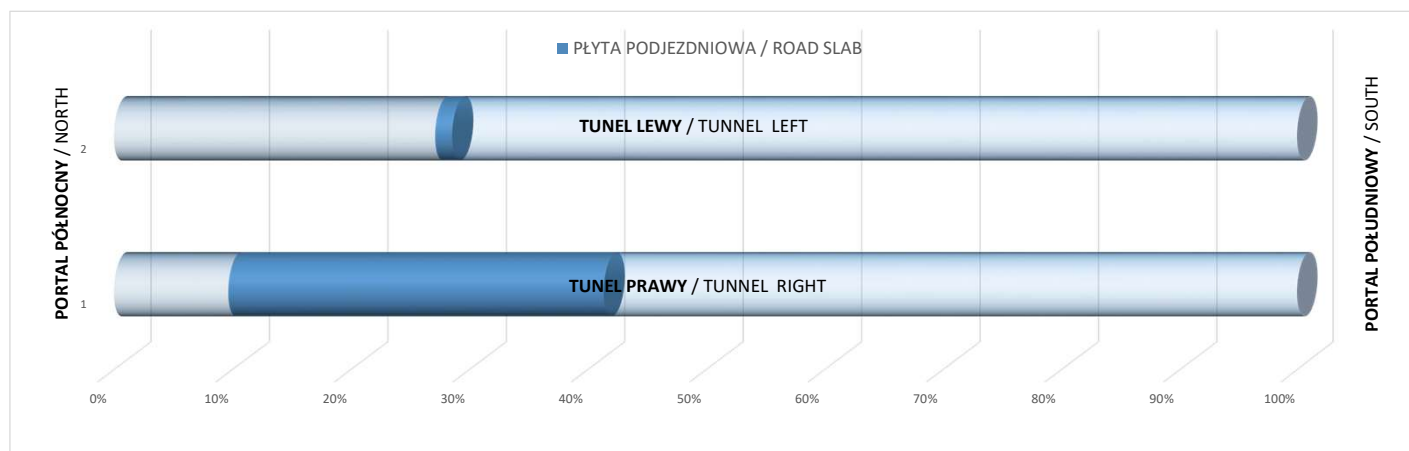

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB		676,80 [mb] [lm]	16,6 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 041,25	647,30 [mb] [lm]	31,7 [%]	
	end km	722 688,55			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 394,54 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
