

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

11.04.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 342,85	90,00 [mb] [lm]
	end km	722 432,85	4,4 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 955,93 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

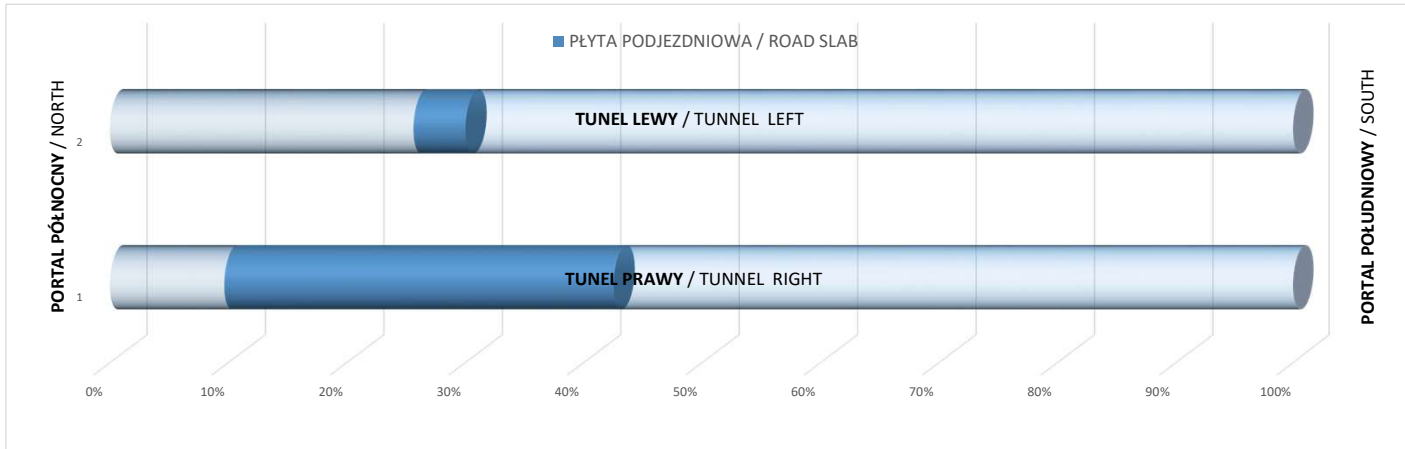

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	761,40 [mb] [lm] 18,6 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 041,25	671,40 [mb] [lm]
	end km	722 712,65	32,9 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 370,44 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
