

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

18.04.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 282,35	211,00 [mb] [lm]
	end km	722 493,35	10,3 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 834,94 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

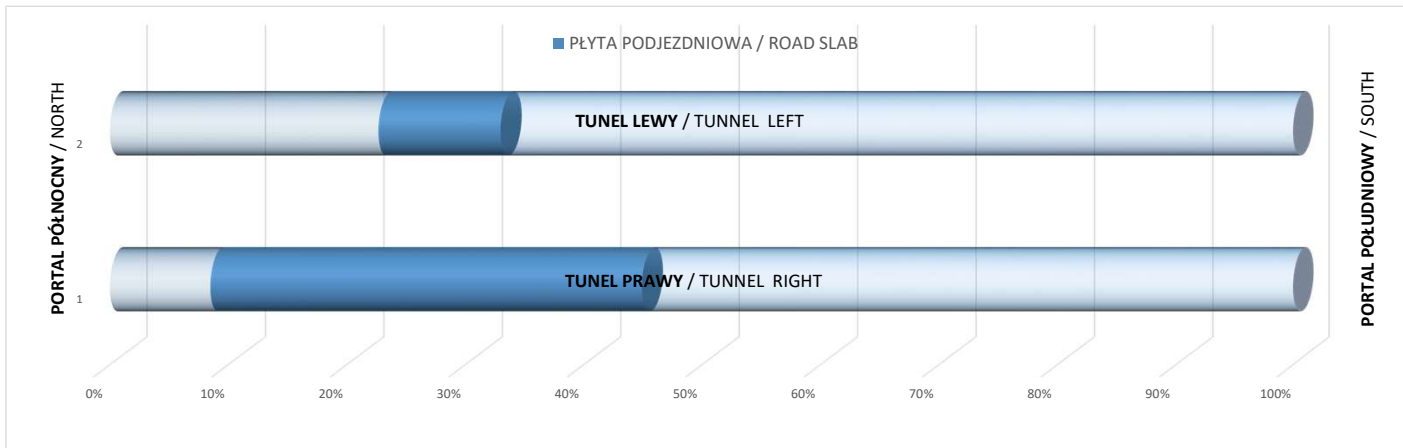

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	955,00 [mb] [lm] 23,4 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 017,25	744,00 [mb] [lm]
	end km	722 761,25	36,4 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 297,84 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
