

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

25.04.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 222,85	331,00 [mb] [lm]
	end km	722 553,85	16,2 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 714,94 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

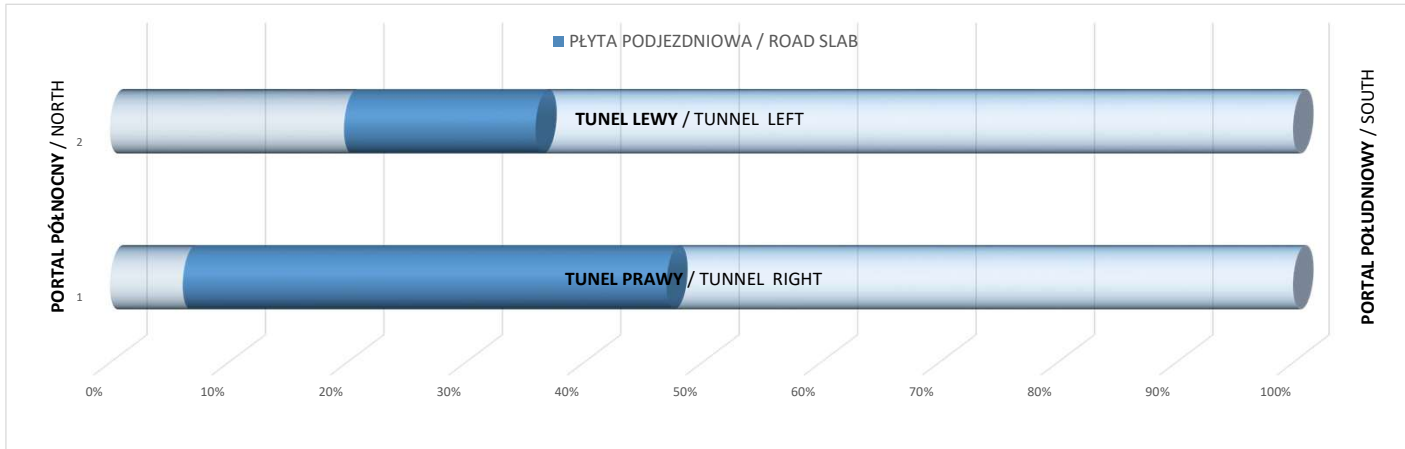

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 165,00 [mb] [lm]	28,5 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 969,75	834,00 [mb] [lm]
	end km	722 803,75	40,8 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 207,84 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
