

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

16.05.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
	start km	722 133,35	540,00 [mb] [lm]
end km	722 673,35	26,4 [%]	

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 505,93 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

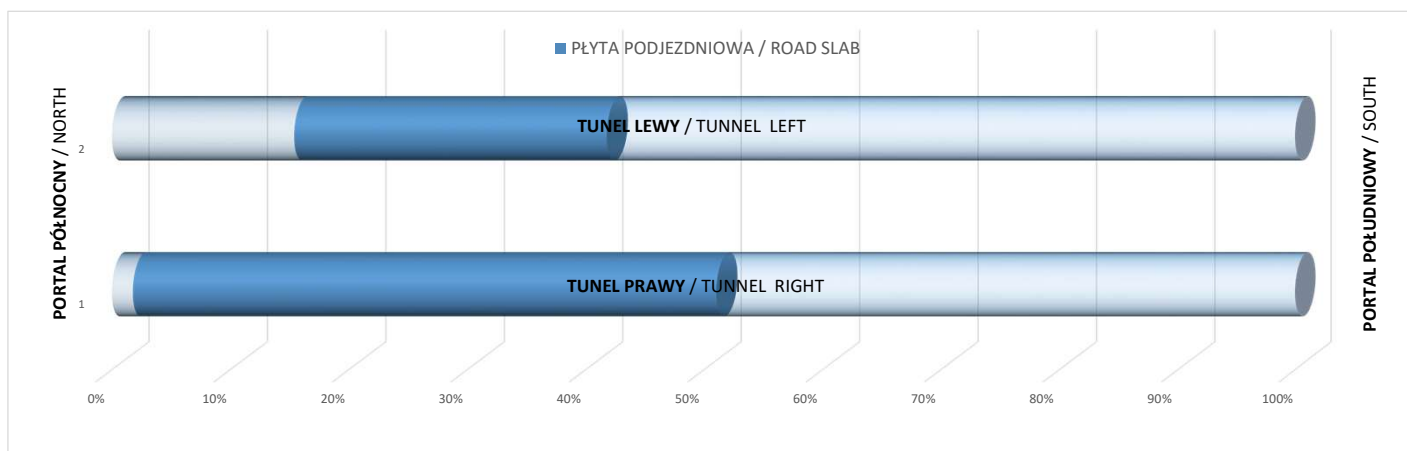

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wykonano / done
	1 545,98 [mb] [lm]
	37,8 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
	start km	721 880,27	1 005,98 [mb] [lm]
end km	722 886,25	49,3 [%]	

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 035,86 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------
