

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

30.05.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 043,85	720,50 [mb] [lm]
	end km	722 764,35	35,2 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 325,43 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

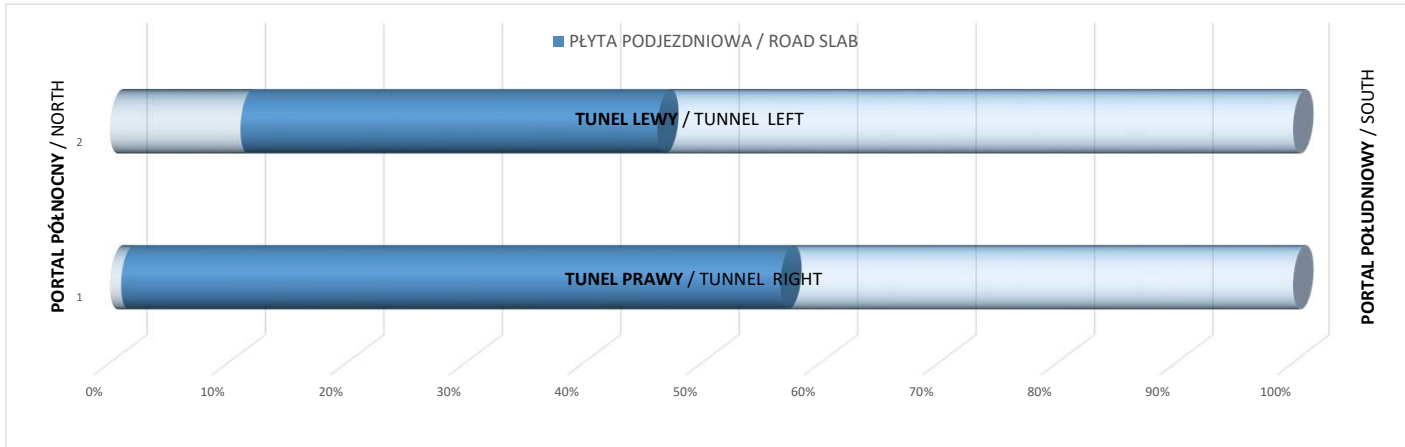

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 857,40 [mb] [lm]	45,4 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 863,36	1 136,90 [mb] [lm]
	end km	723 000,26	55,7 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	904,95 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------
