

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

06.06.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	722 013,35	774,20 [mb] [lm]	37,8 [%]	
	end km	722 787,55			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 271,73 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

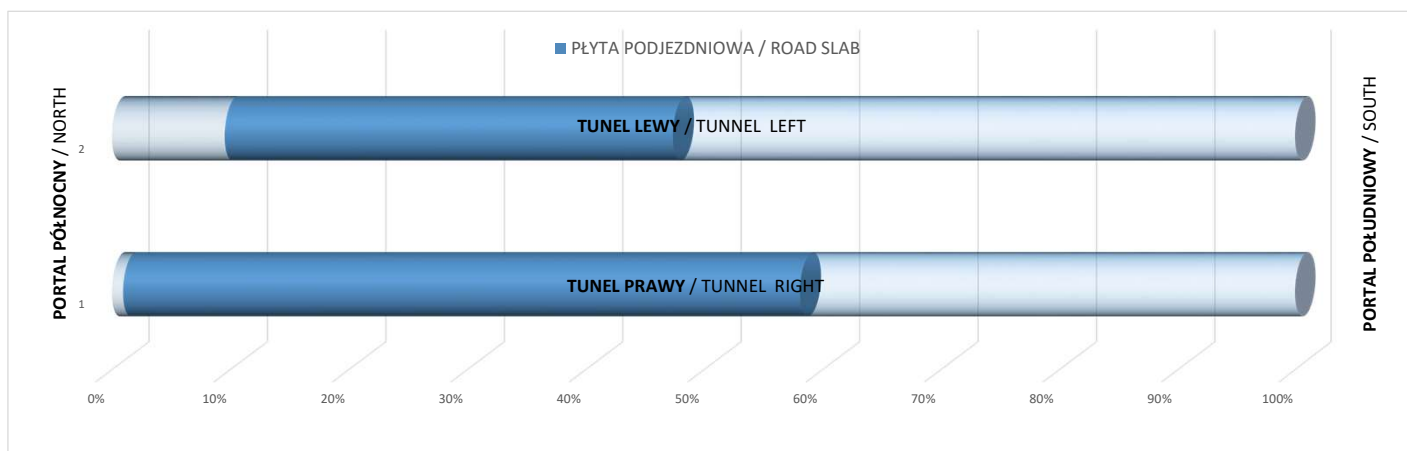

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 941,10 [mb] [lm]	47,5 [%]	

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 863,36	1 166,90 [mb] [lm]	57,1 [%]	
	end km	723 030,26			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	874,95 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------
