

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

27.06.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
	start km	721 922,35	961,00 [mb] [lm]
end km	722 883,35		

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 084,93 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

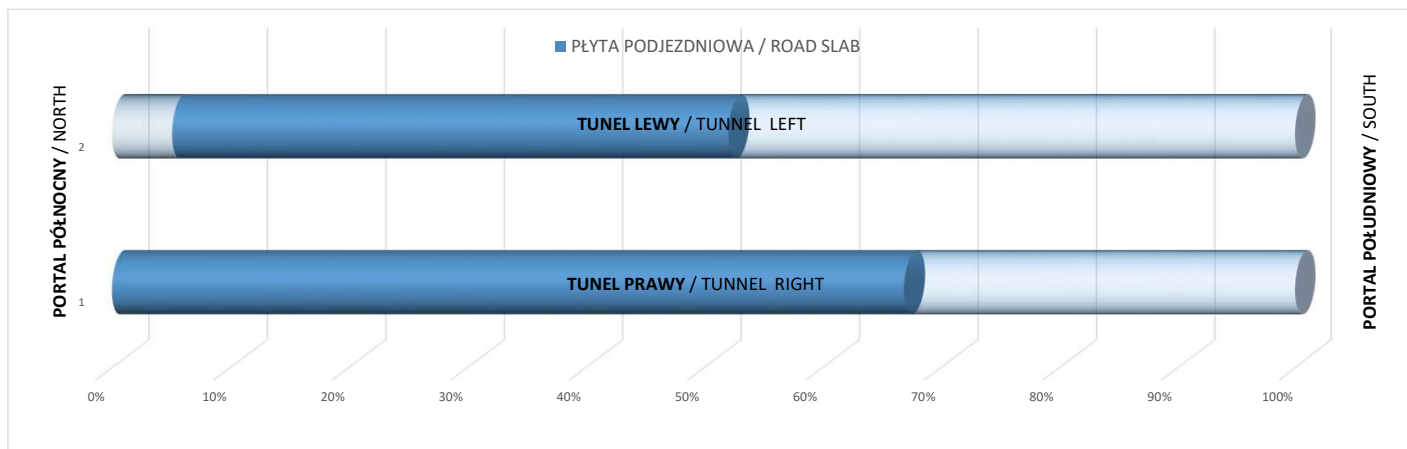

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wykonano / done
	2 326,60 [mb] [lm]
	56,9 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
	start km	721 844,16	1 365,60 [mb] [lm]
end km	723 209,76		

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	676,24 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------
