

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

04.07.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 922,35	991,00 [mb] [lm]
	end km	722 913,35	48,4 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	1 054,93 [mb] [lm]
---------------------------------	-----------------------

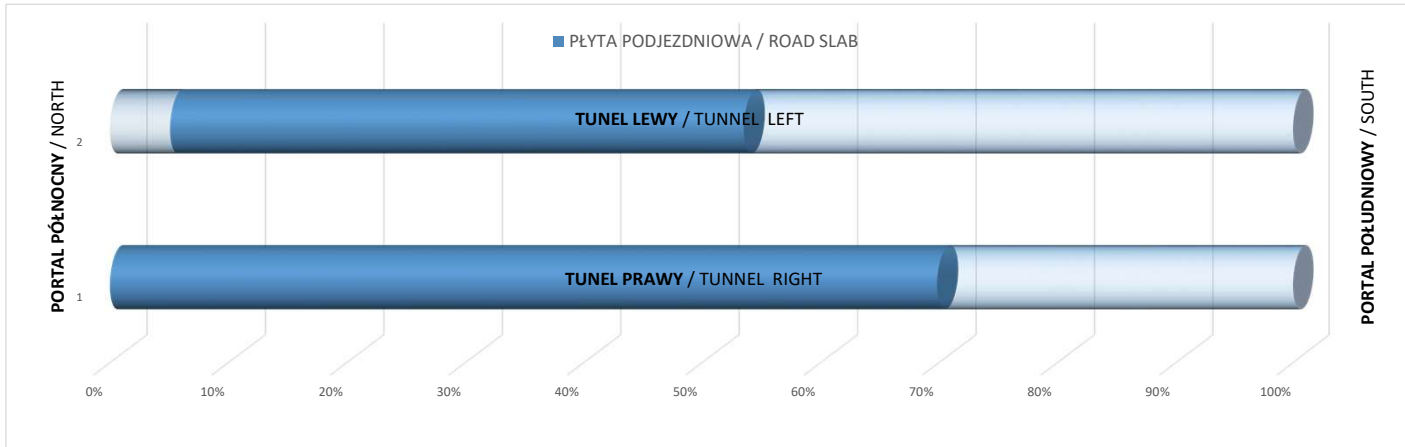

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

	wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	2 417,10 [mb] [lm] 59,1 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 426,10 [mb] [lm]
	end km	723 270,26	69,8 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	615,74 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------
