

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

11.07.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 893,84	1 050,02 [mb] [lm]	51,3 [%]	
	end km	722 943,85			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	995,92 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

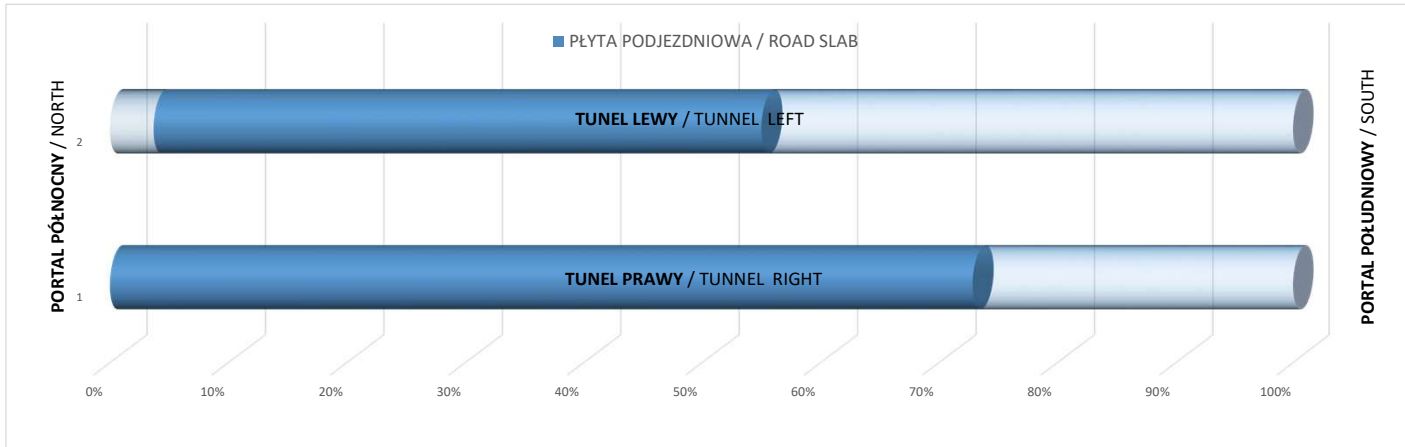

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB		2 537,28 [mb] [lm]	62,1 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 487,26 [mb] [lm]	72,8 [%]	
	end km	723 331,42			

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	554,58 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------
