

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

01.08.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA


ROAD SLAB

start km	721 837,20	1 196,15 [mb] [lm]
end km	723 033,35	58,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

849,78 [mb]
[lm]

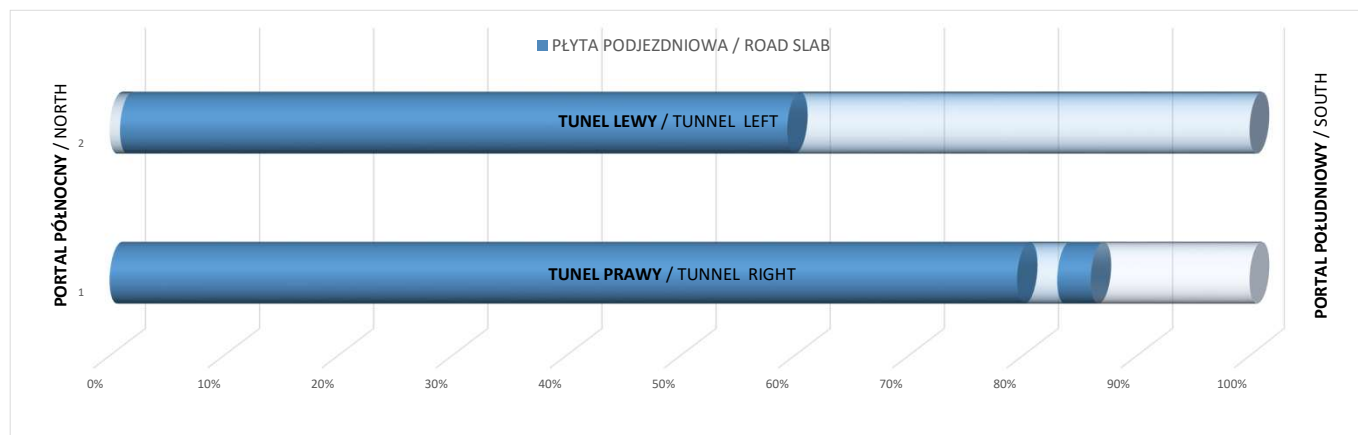

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

2 879,84 [mb]
[lm]

70,5 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

start km	721 844,16	1 623,69 [mb] [lm]
end km	723 467,85	79,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

358,15 [mb]
[lm]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

start km	723 539,67	60,00 [mb] [lm]
end km	723 599,67	2,9 [%]
