

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

08.08.2021

### TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA


TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 837,20	1 256,15 [mb] [lm]
	end km	723 093,35	61,4 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	789,78 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

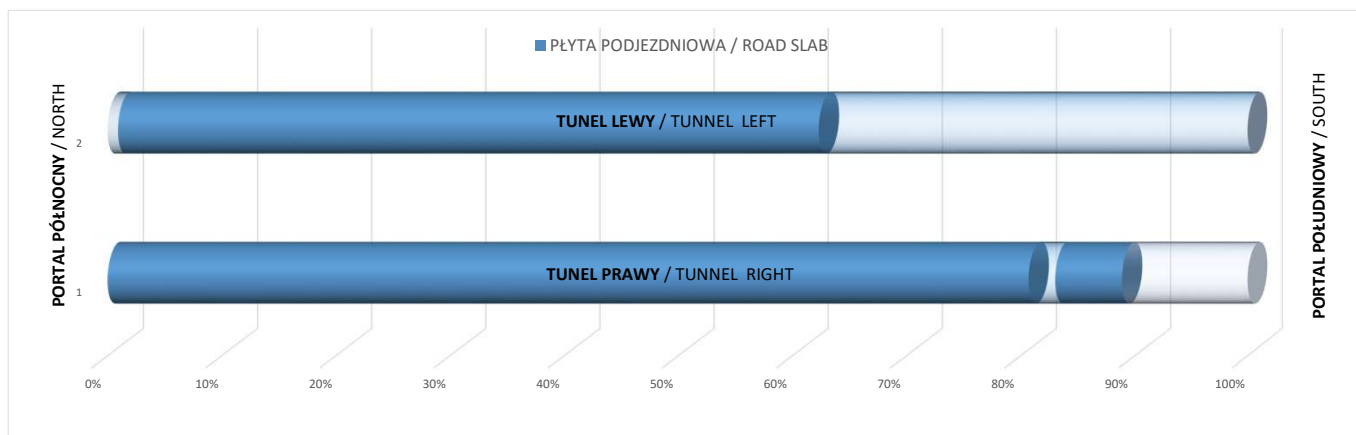

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	3 023,17 [mb] [lm]	74,0 [%]
---------------------------------	-----------------------	----------

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 647,69 [mb] [lm]
	end km	723 491,85	80,7 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	274,82 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	723 539,67	119,33 [mb] [lm]
	end km	723 659,00	5,8 [%]
