

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

15.08.2021

### TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA


TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 837,20	1 316,15 [mb] [lm]
	end km	723 153,35	64,3 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	729,78 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

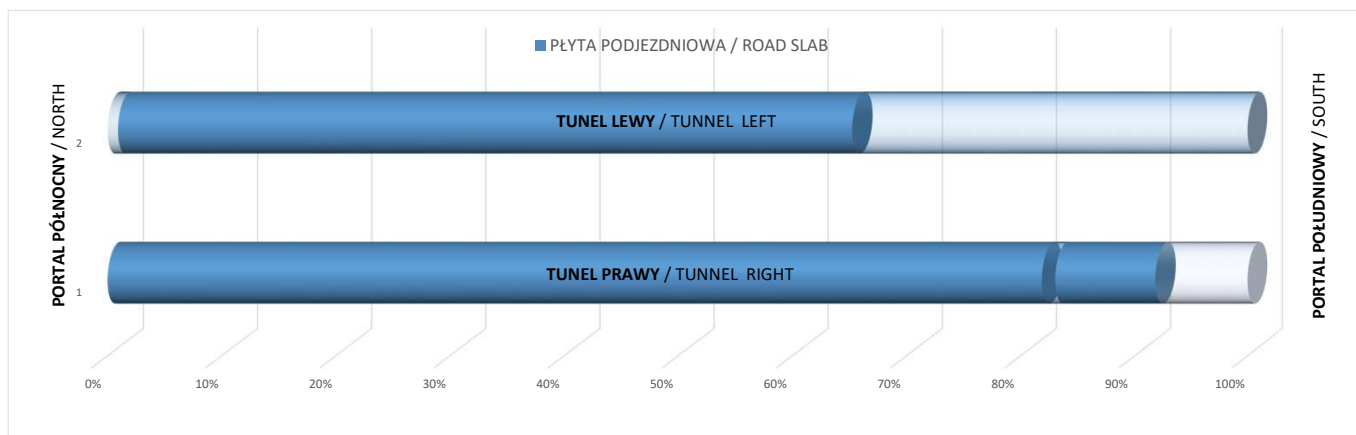

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	3 166,97 [mb] [lm]	77,5 [%]
---------------------------------	-----------------------	----------

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 671,69 [mb] [lm]
	end km	723 515,85	81,9 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	191,02 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	723 539,67	179,13 [mb] [lm]
	end km	723 718,80	8,8 [%]
