

# PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

05.09.2021

## TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46		0,00	[mb] [lm]
	end km	721 818,46		0	[%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	2 059,46	[mb] [lm]
--	----------	--------------

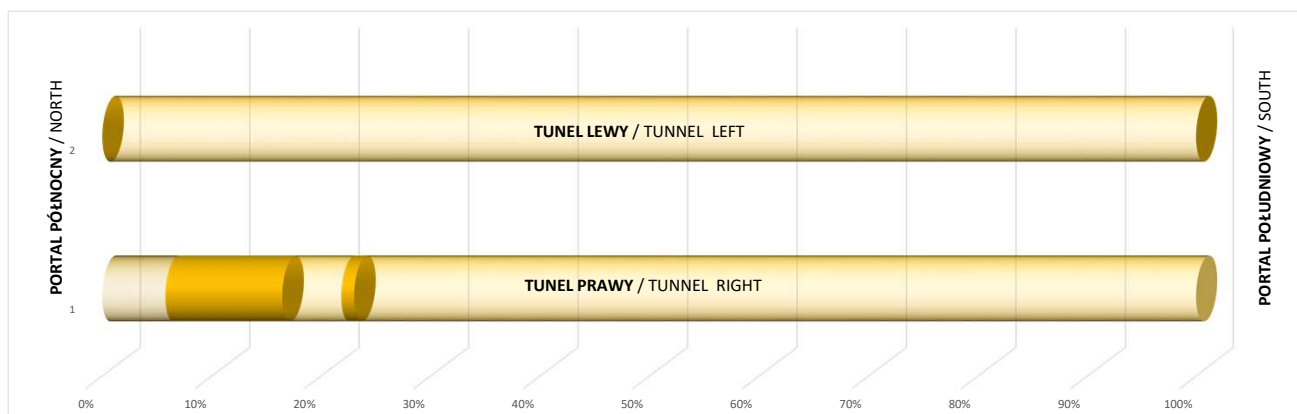

## TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION		242,00	[mb] [lm]
		6	[%]

## TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

## POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 961,85		218,00	[mb] [lm]
	end km	722 179,85		11	[%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 812,96	[mb] [lm]
--	----------	--------------

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	722 289,85		24,00	[mb] [lm]
	end km	722 313,85		1	[%]
