

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

12.09.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH


wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 818,46	1 514,84 [mb] [lm]
	end km	723 333,29	74,0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	439,80 [mb] [lm]
---------------------------------	---------------------

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	723 394,25	91,70 [mb] [lm]
	end km	723 485,95	4,5 [%]

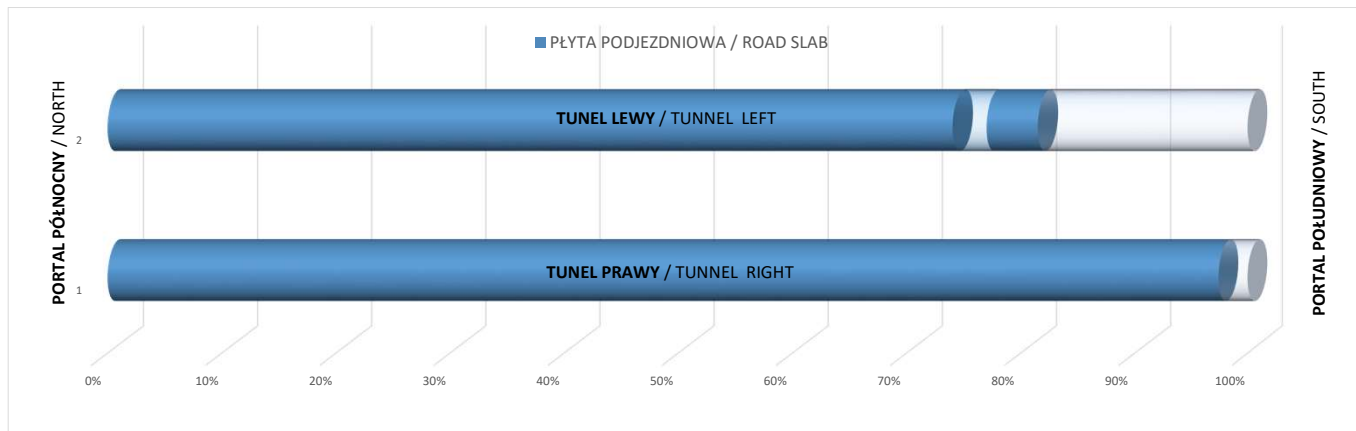

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	3 503,02 [mb] [lm]
	85,7 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	start km	721 844,16	1 988,18 [mb] [lm]
	end km	723 832,34	97,4 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA ROAD SLAB	53,66 [mb] [lm]
---------------------------------	--------------------
