

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

12.09.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA


FIRE PROTECTION

start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
end km	721 818,46	0 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

2 059,46 [mb]
[lm]

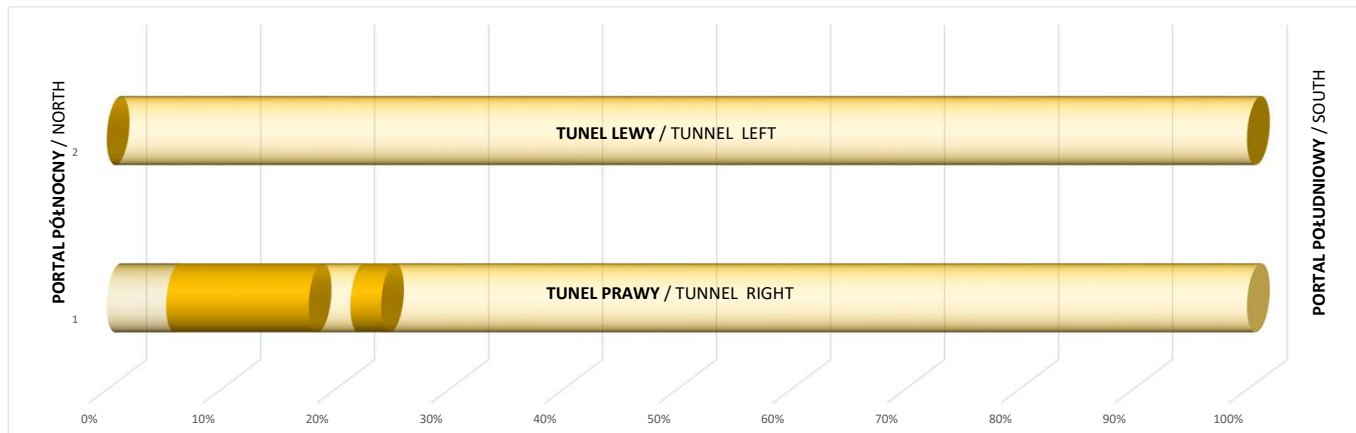

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

309,00 [mb]
[lm]
8 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

start km	721 949,85	254,00 [mb] [lm]
end km	722 215,85	12 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

1 745,96 [mb]
[lm]

* NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 179,85 do km 722 191,85

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

start km	722 289,85	55,00 [mb] [lm]
end km	722 344,85	3 [%]
