

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

10.10.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel


wykonano / done

start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
end km	721 818,46	0 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

2 059,46 [mb]
[lm]

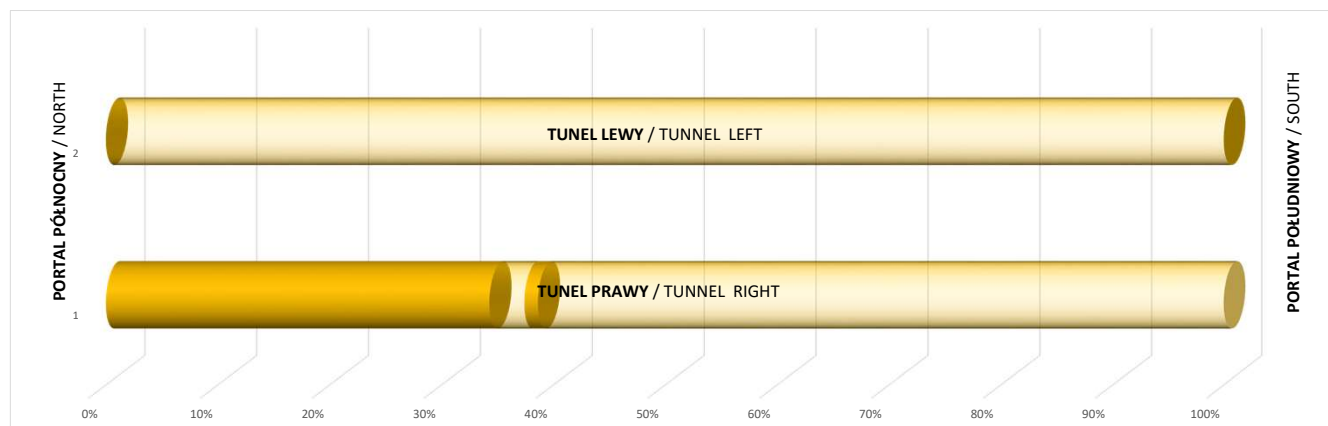

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

703,19 [mb]
[lm]

17 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	721 844,16	679,19 [mb] [lm]
end km	722 583,85	33 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

1 351,77 [mb]
[lm]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb), 722 461,35 - 722+473,85 (12,5 mb),
722 523,85 - 722 535,85 (12 mb)

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

start km	722 645,85	24,00 [mb] [lm]
end km	722 669,85	1 [%]
