

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

17.10.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA


ROAD SLAB

start km	721 818,46	1 878,63 [mb] [lm]
end km	723 697,09	91,8 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

167,71 [mb]
[lm]

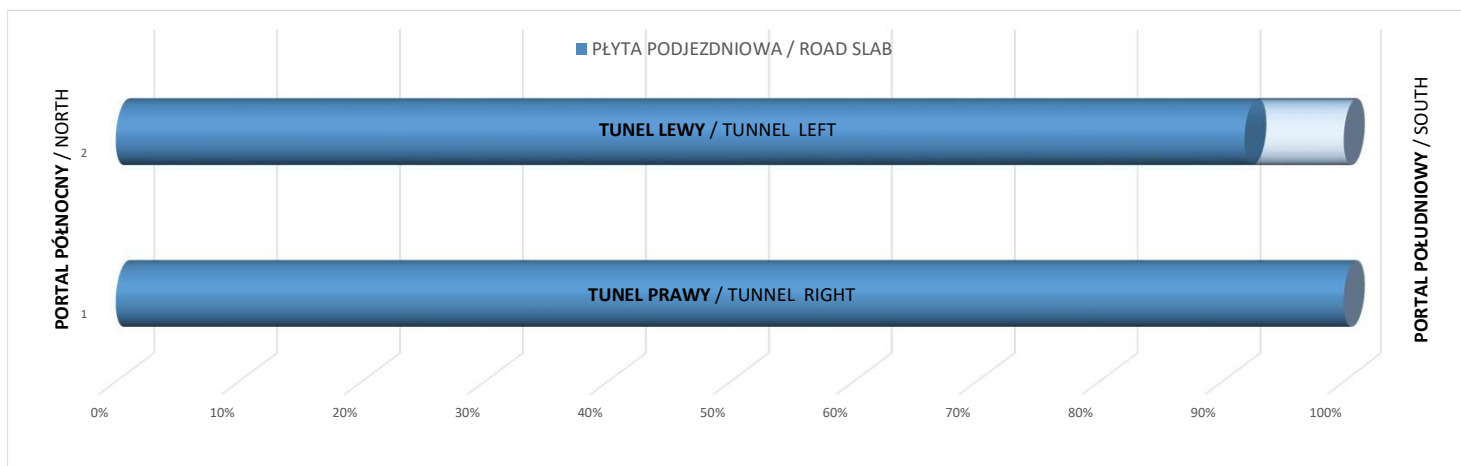

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

3 920,47 [mb]
[lm]

95,9 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

start km	721 844,16	2 041,84 [mb] [lm]
end km	723 886,00	100,0 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

0,00 [mb]
[lm]
