

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

17.10.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]	0 [%]	
	end km	721 818,46			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	2 059,46 [mb] [lm]
--	-----------------------

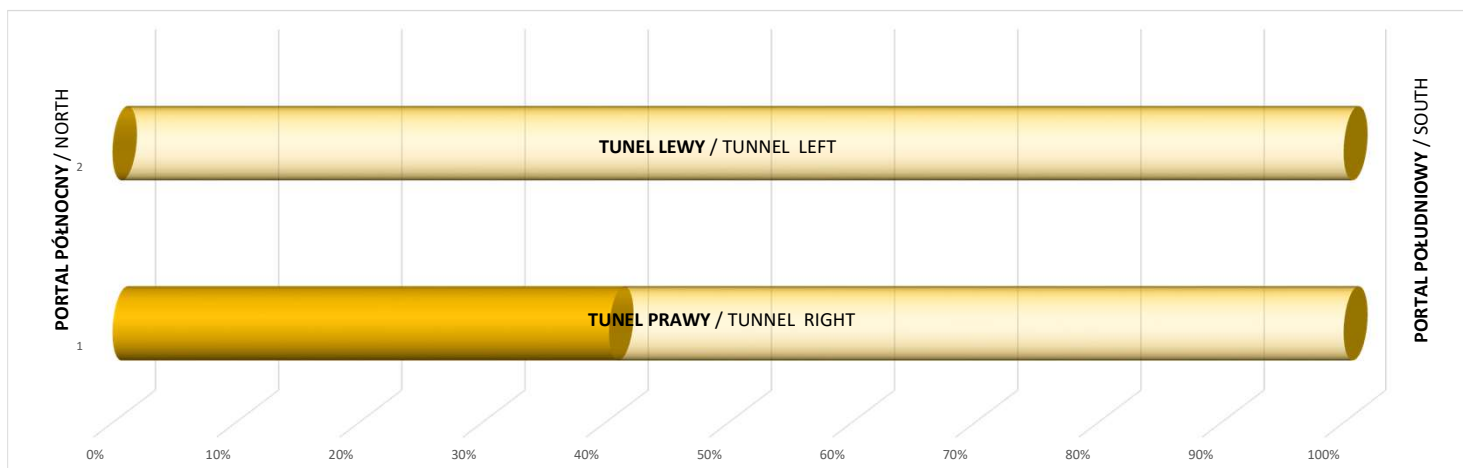

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	803,69 [mb] [lm]	20 [%]	

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16	803,69 [mb] [lm]	39 [%]	
	end km	722 695,85			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 251,27 [mb] [lm]
--	-----------------------

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb), 722 523,85 - 722 535,85 (12 mb)
