

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

21.11.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA


TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	140,31 [mb] [lm]
	end km	721 958,77	7 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 875,91 [mb] [lm]
	43,24 [mb] [lm]
RAZEM TOTAL	1 919,15 [mb] [lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

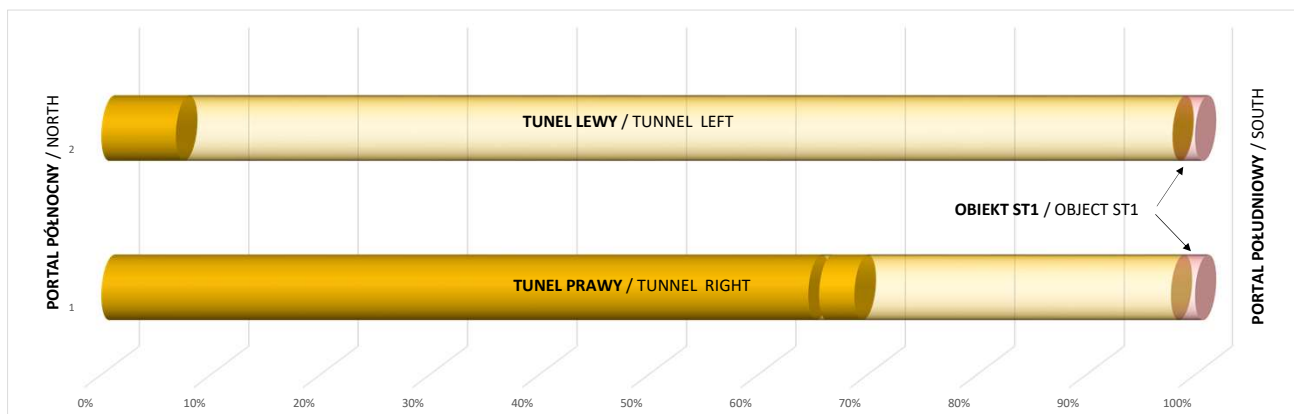

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

	wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 444,58 [mb] [lm]
	35 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16	1 242,24 [mb] [lm]
	end km	723 206,40	60 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	707,45 [mb] [lm]
	43,24 [mb] [lm]
RAZEM TOTAL	750,69 [mb] [lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb; CP008), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb; CP023), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb; CP039), 722 523,85 - 722 535,85 (12 mb; CP055), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 722 869,40 - 722 881,40 (12 mb; CP087), 723 041,40 - 723 053,40 (12 mb; CP103), 723 127,40 - 723 139,40 (12 mb; CP111), 723 151,40 - 723 175,40 (24 mb; CP113-114)

	wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	723 225,40	62,03 [mb] [lm]
	end km	723 299,43	3 [%]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 723 273,43 - 723 285,43 (12 mb; CP124)
