

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

12.12.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	184,31 [mb] [lm]
	end km	722 002,77	9 [%]

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	722 618,76	36,00 [mb] [lm]
	end km	722 692,76	2 [%]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet od km 722 642,76 - 722 680,76 (38mb; CL069-072)


POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 831,91 [mb] [lm]
	43,24 [mb] [lm]
RAZEM TOTAL	1 875,15 [mb] [lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

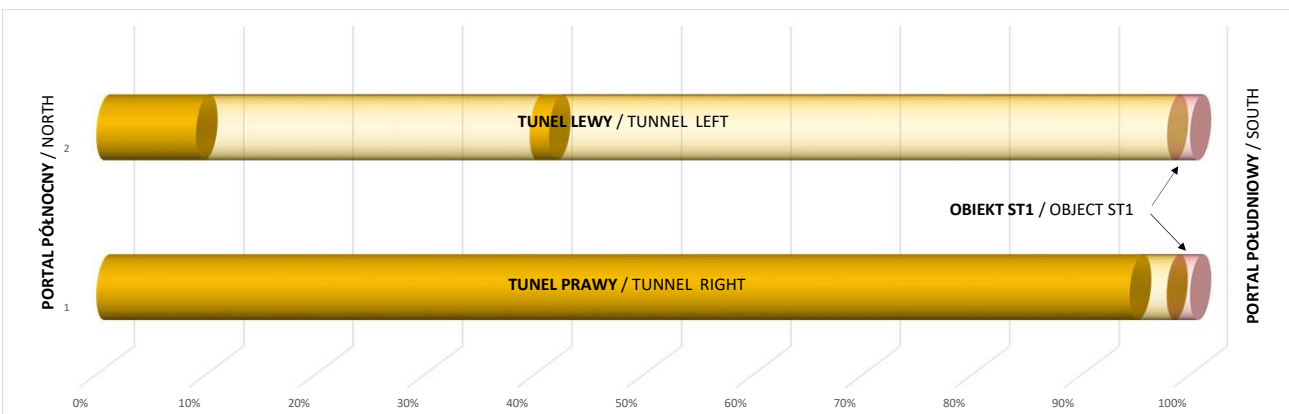

TUNEL LEWY I PRAWY oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	2 092,72 [mb] [lm]	51 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel	wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16	1 872,41 [mb] [lm]
	end km	723 788,57	91 [%]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet od km 722 351,85 - 722 363,85 (12mb; CP039), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 722 869,40 - 722 881,40 (12 mb; CP087), 723 213,40 - 723 225,40 (12 mb; CP119), 723 557,43 - 723 569,43 (12mb; CP151), 723 728,57 - 723740,57 (12 mb; CP166)

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	139,31 [mb] [lm]
	43,24 [mb] [lm]
RAZEM TOTAL	182,55 [mb] [lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1
