

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

26.12.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

| | | |
|------------------------------|----------------|--------------------|
| POWŁOKA OGNIIOCHRONNA | ŁĄCZNIE | 438,81 [mb] |
| FIRE PROTECTION | TOTAL | [lm] |
| | | 21 [%] |

WYKONANE ODCINKI / sections done

| [km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel | | wykonano / done |
|--|--------------|-----------------|
| 721 818,46 | - 722 026,77 | 208,31 [mb] |
| 722 371,76 | - 722 395,76 | 24,00 [mb] |
| 722 618,76 | - 722 740,76 | 122,00 [mb] |
| 722 874,97 | - 722 911,47 | 36,50 [mb] |
| 723 186,47 | - 723 234,47 | 48,00 [mb] |


POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POWŁOKA OGNIIOCHRONNA | 1 577,41 [mb] |
| FIRE PROTECTION | [lm] |
| RAZEM | 43,24 [mb] |
| TOTAL | [lm] |
| RAZEM | 1 620,65 [mb] |
| TOTAL | [lm] |

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

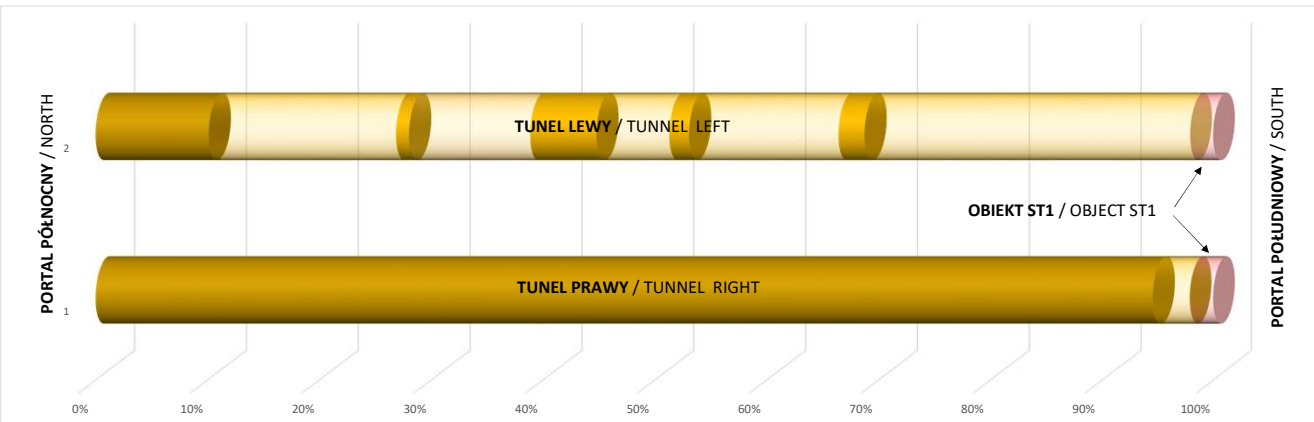

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

| | |
|------------------------------|----------------------|
| POWŁOKA OGNIIOCHRONNA | 2 347,22 [mb] |
| FIRE PROTECTION | [lm] |
| | 57 [%] |

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

| wg osi tunelu / by axis of the tunnel | | wykonano / done |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| POWŁOKA OGNIIOCHRONNA | start km 721 844,16 | 1 908,41 [mb] |
| FIRE PROTECTION | end km 723 788,57 | [lm] |
| | | 93 [%] |

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

| | |
|------------------------------|--------------------|
| POWŁOKA OGNIIOCHRONNA | 103,31 [mb] |
| FIRE PROTECTION | [lm] |
| | 43,24 [mb] |
| RAZEM | 146,55 [mb] |
| TOTAL | [lm] |

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 351,85 - 722 363,85 (12mb; CP039), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 723 213,40 - 723 225,40 (12 mb; CP119)
