

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

16.01.2022

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	ŁĄCZNIE	691,02 [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		34 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
721 818,46	- 722 065,77	247,31 [mb]
722 371,76	- 722 410,76	39,00 [mb]
722 618,76	- 722 975,47	356,71 [mb]
		0,00 [mb]
723 186,47	- 723 234,47	48,00 [mb]


POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	1 325,20 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	1 368,44 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

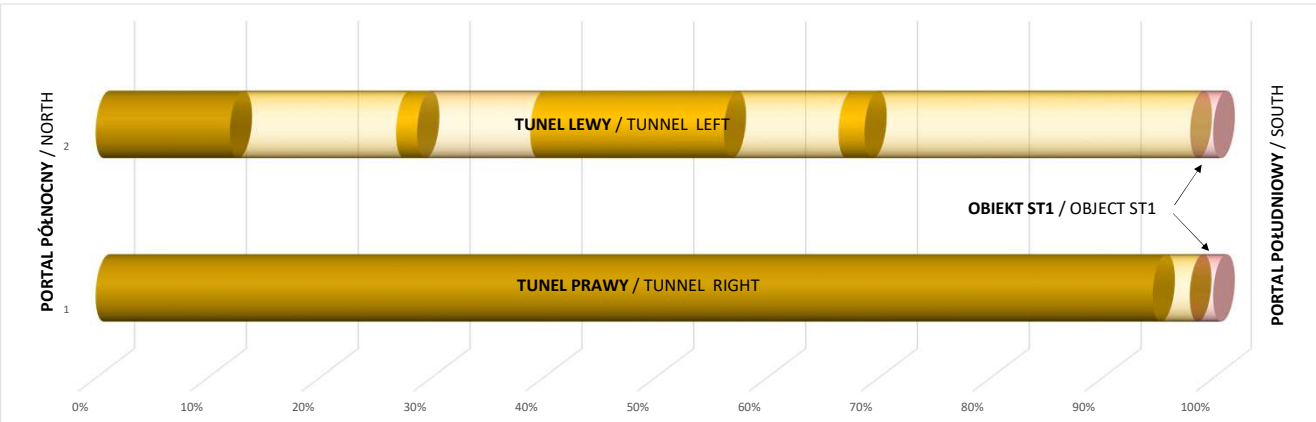

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	2 599,43 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	63 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start km 721 844,16	1 908,41 [mb]
FIRE PROTECTION	end km 723 788,57	[lm]
		93 [%]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	103,31 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	146,55 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 351,85 - 722 363,85 (12mb; CP039), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 723 213,40 - 723 225,40 (12 mb; CP119)
