

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIOOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

23.01.2022

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POWŁOKA OGNIOOCHRONNA	ŁĄCZNIE	838,02 [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		41 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
721 818,46	- 722 077,77	259,31 [mb]
722 371,76	- 722 458,76	87,00 [mb]
722 618,76	- 722 987,47	368,71 [mb]
		0,00 [mb]
723 186,47	- 723 309,47	123,00 [mb]


POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIOOCHRONNA	1 178,20 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	1 221,44 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

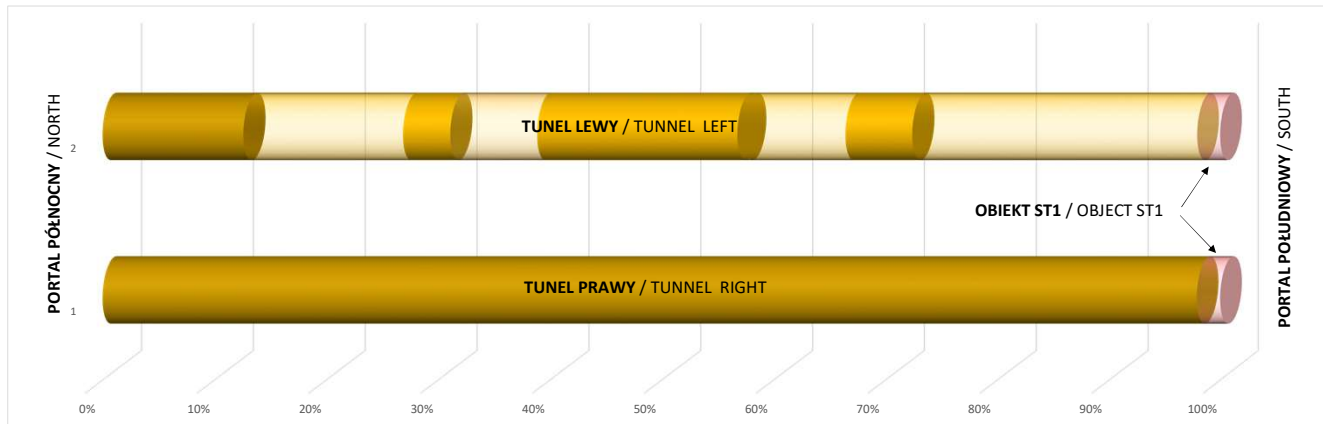

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

POWŁOKA OGNIOOCHRONNA	2 813,74 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	68 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIOOCHRONNA	start km 721 844,16	1 975,72 [mb]
FIRE PROTECTION	end km 723 855,88	[lm]
		96 [%]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIOOCHRONNA	36,00 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	43,24 [mb]
	[lm]
RAZEM	79,24 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 351,85 - 722 363,85 (12mb; CP039), 722 695,85 - 722 707,85 (12 mb; CP071), 723 213,40 - 723 225,40 (12 mb; CP119)
