

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

10.04.2022

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	ŁĄCZNIE	1 812,06 [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		88 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

721 818,46 - 722 163,77	345,31 [mb]
[lm]	[lm]
722 249,76 - 723 124,47	874,71 [mb]
[lm]	[lm]
723 186,47 - 723 778,51	592,04 [mb]
[lm]	[lm]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA


TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	204,16 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
43,24 [mb]	[lm]
RAZEM	247,40 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

PORTAL PÓŁNOCNY / NORTH

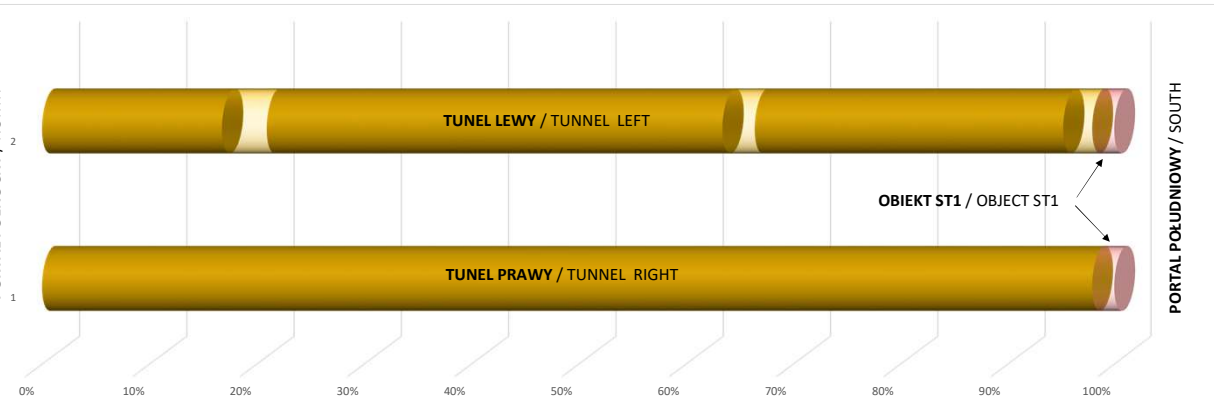

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	3 823,78 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	93 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start	721 844,16	2 011,72 [mb]
FIRE PROTECTION	km	[km]	[lm]
	end	723 855,88	98 [%]
	km	[km]	

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	0,00 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
43,24 [mb]	[lm]
RAZEM	43,24 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

OBIEKT ST1

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start	723 855,88	0,00 [mb]
FIRE PROTECTION	km	[km]	[lm]
	end	723 899,12	0 [%]
	km	[km]	
