

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

24.04.2022

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

ŁĄCZNIE

TOTAL

1 966,22 [mb]
[lm]

95 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

721 818,46	-	723 136,47	1 318,02 [mb] [lm]
------------	---	------------	-----------------------

723 186,47	-	723 834,67	648,20 [mb] [lm]
------------	---	------------	---------------------

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

50,00 [mb]
[lm]

43,24 [mb]
[lm]


RAZEM

TOTAL

93,24 [mb]
[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

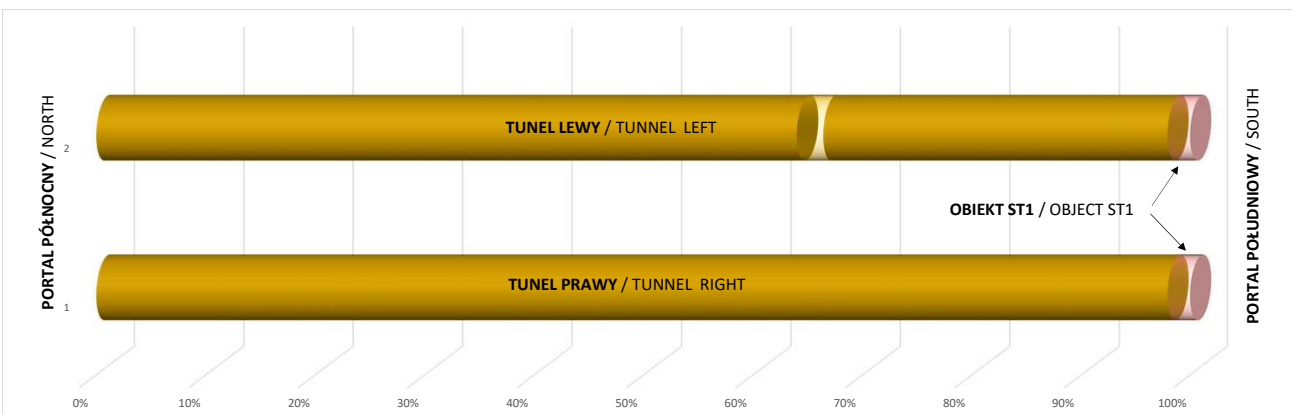

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

3 977,94 [mb]
[lm]

97 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	721 844,16	2 011,72 [mb] [lm]
end km	723 855,88	98 [%]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

0,00 [mb]
[lm]

43,24 [mb]
[lm]

RAZEM

TOTAL

43,24 [mb]
[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1

OBIEKT ST1

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA

FIRE PROTECTION

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	723 855,88	0,00 [mb] [lm]
end km	723 899,12	0 [%]
