

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

2022-05-22

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT


POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	ŁĄCZNIE	1 997,22 [mb]
FIRE PROTECTION	TOTAL	[lm]
		97 [%]

WYKONANE ODCINKI / sections done

[km] wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
721 818,46	- 723 148,47	1 330,02 [mb]
		[lm]
723 167,47	- 723 834,67	667,20 [mb]
		[lm]

OBIEKT ST1

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start km 723 834,67	41,24 [mb]
FIRE PROTECTION	end km 723 875,91	[lm]
		2,00 [%]

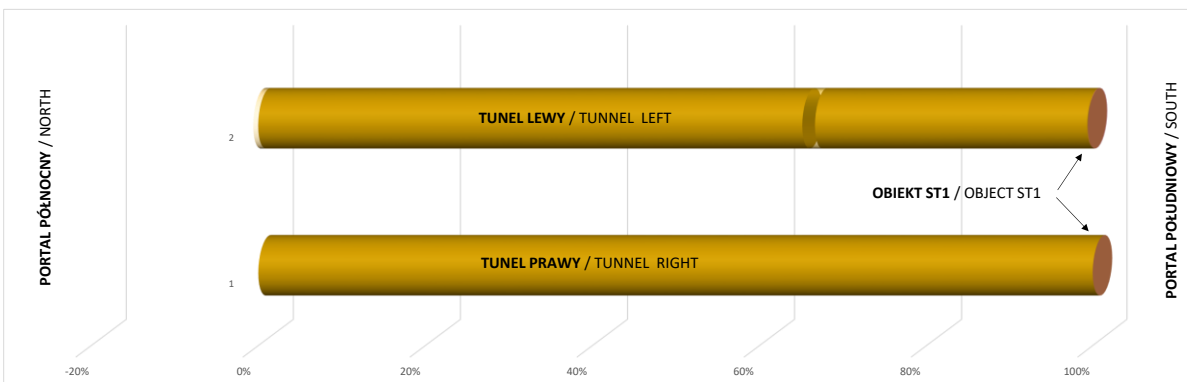

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start km 721 844,16	2 011,72 [mb]
FIRE PROTECTION	end km 723 855,88	[lm]
		98 [%]

OBIEKT ST1

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	start km 723 855,88	43,23 [mb]
FIRE PROTECTION	end km 723 899,12	[lm]
		2 [%]

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	19,00 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	2,00 [mb]
	[lm]
RAZEM	21,00 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL LEWY

OBIEKT ST1

TUNEL LEWY I PRAWY

oraz OBIEKT ST1

TUNNEL LEFT AND RIGHT and OBJ. ST1

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	4 093,41 [mb]	
FIRE PROTECTION	[lm]	
	98 [%]	

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA	0,00 [mb]
FIRE PROTECTION	[lm]
	0,00 [mb]
	[lm]
RAZEM	0,00 [mb]
TOTAL	[lm]

TUNEL PRAWY

OBIEKT ST1
