

TUNEL 2			
Lewy Left			
	wg. osi tunelu by axis of the tunnel	Aktualny Actual	
Drażenie Drill	km 723 477	1584,41 [m b.] [lm]	82,42 %
Spąg Invert	km 723 359	1466,61 [m b.] [lm]	76,29 %
Kalota* Top crown	km 723 359	1386,40 [m b.] [lm]	72,12 %

*na odcinku / on section :
721+892,856 - 721+910,306, 722+812,210 - 722+874,970
nie ma jeszcze wykonanych kalot / there is no top crowns yet

TUNEL 4			
Lewy Left			
	wg. osi tunelu by axis of the tunnel	Aktualny Actual	
Drażenie Drill	km 723 477	337,95 [m b.] [lm]	17,58 %
Spąg Invert	km 723 359	455,75 [m b.] [lm]	23,71 %
Kalota* Top crown	km 723 692	15,00 [m b.] [lm]	0,78 %


*na odcinku / on section :
723+706,510 - 723+815,217
nie ma jeszcze wykonanych kalot - there is no top crowns yet

TUNEL 2+4			
Lewy Left			
		Aktualny Actual	
Drażenie Drill		1922,36 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		1922,36 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		1401,40 [m b.] [lm]	72,90 %

POZOSTAŁO DO WYKONANIA / TO FINISH			
Lewy Left			
Drażenie Drill		0 [m b.] [lm]	
Spąg Invert		0 [m b.] [lm]	
Kalota Top crown		521 [m b.] [lm]	

Portal N - północny | North

Portal S - południowy | South

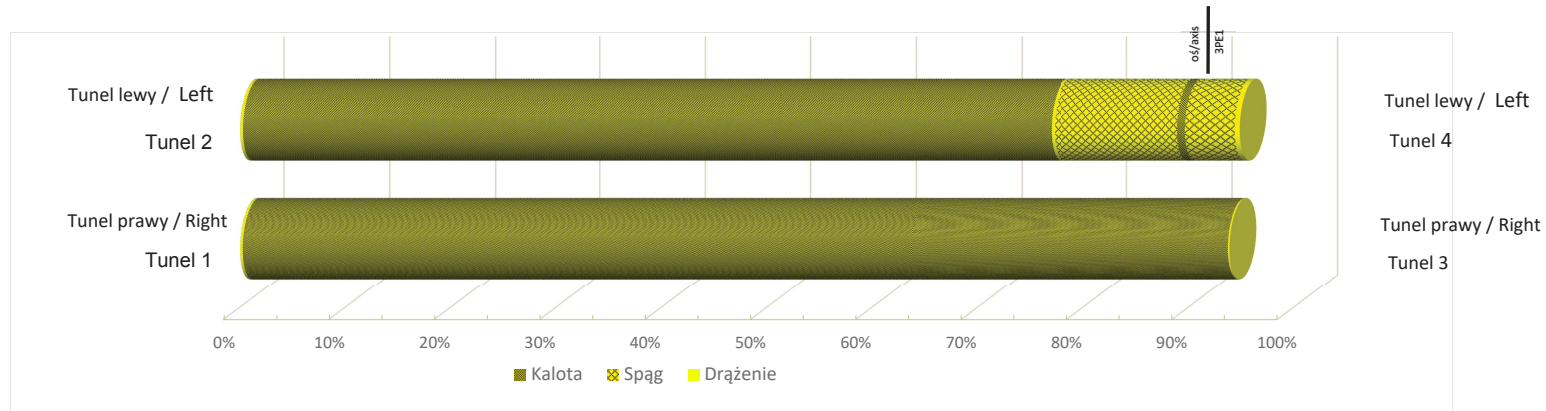

TUNEL Prawy i Lewy			
Prawy i lewy Right and left			
		Aktualny Actual	
Drażenie Drill		3839,46 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		3839,46 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		3318,50 [m b.] [lm]	86,43 %

TUNEL 1			
Prawy Right			
	wg. osi tunelu by axis of the tunnel	Aktualny Actual	
Drażenie Drill	km 723 303	1382,90 [m b.] [lm]	72,13 %
Spąg Invert	km 723 237	1317,40 [m b.] [lm]	68,72 %
Kalota Top crown	km 723 292	1372,43 [m b.] [lm]	71,59 %

TUNEL 3			
Prawy Right			
	wg. osi tunelu by axis of the tunnel	Aktualny Actual	
Drażenie Drill	km 723 303	534,20 [m b.] [lm]	27,87 %
Spąg Invert	km 723 237	599,70 [m b.] [lm]	31,28 %
Kalota Top crown	km 723 292	544,67 [m b.] [lm]	28,41 %

TUNEL 1+3			
Prawy Right			
		Aktualny Actual	
Drażenie Drill		1917,10 [m b.] [lm]	100 %
Spąg Invert		1917,10 [m b.] [lm]	100 %
Kalota Top crown		1917,10 [m b.] [lm]	100 %

POZOSTAŁO DO WYKONANIA / TO FINISH			
Prawy Right			
Drażenie Drill		0 [m b.] [lm]	
Spąg Invert		0 [m b.] [lm]	
Kalota Top crown		0 [m b.] [lm]	
