

## PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

**21.03.2021**

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
<b>PŁYTA PODJEZDNIOWA</b>	<b>km</b>	<b>721 818,46</b>	<b>0,00</b> [mb] [lm]
ROAD SLAB			0 [%]

<b>PŁYTA PODJEZDNIOWA</b>	[mb] [lm]
ROAD SLAB	

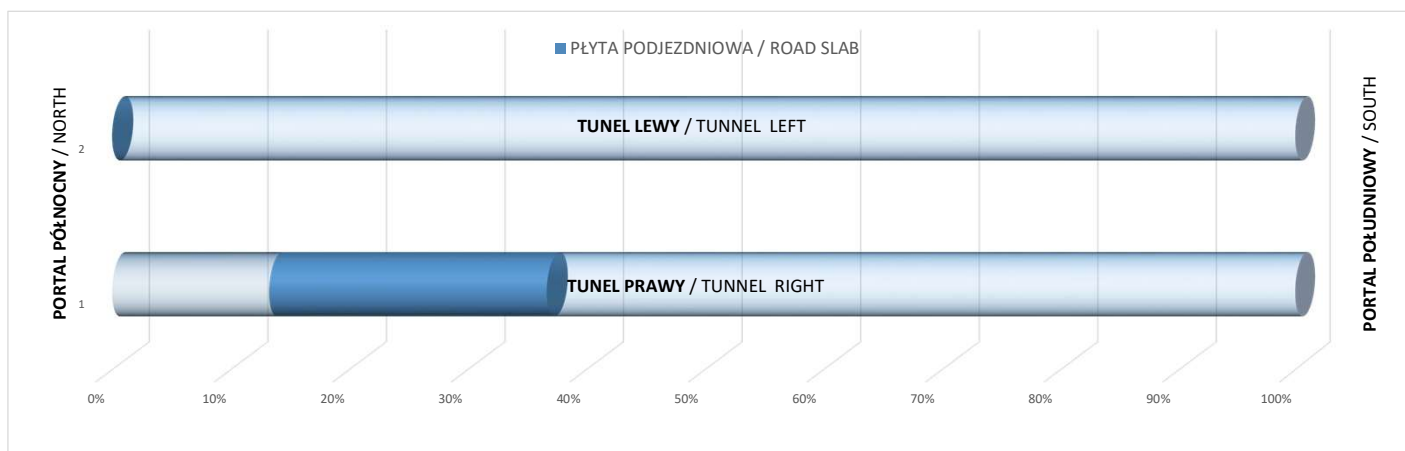

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done	
<b>PŁYTA PODJEZDNIOWA</b>	<b>478,00</b> [mb] [lm]
ROAD SLAB	11,7 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
<b>PŁYTA PODJEZDNIOWA</b>	<b>km</b>	<b>722 592,55</b>	<b>478,00</b> [mb] [lm]
ROAD SLAB			23,4 [%]
od/from km		<b>722 114,55</b>	

<b>PŁYTA PODJEZDNIOWA</b>	<b>1 563,84</b> [mb] [lm]
ROAD SLAB	
