

PROGRES DLA PŁYTY PODJEZDNIOWEJ

PROGRESS FOR THE ROAD SLAB

Progres na dzień:

Progress for day:

19.09.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	721 818,46	1 545,84 [mb] [lm]
end km	723 364,29	75,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

348,85 [mb]
[lm]


PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	723 394,25	151,65 [mb] [lm]
end km	723 545,90	7,4 [%]

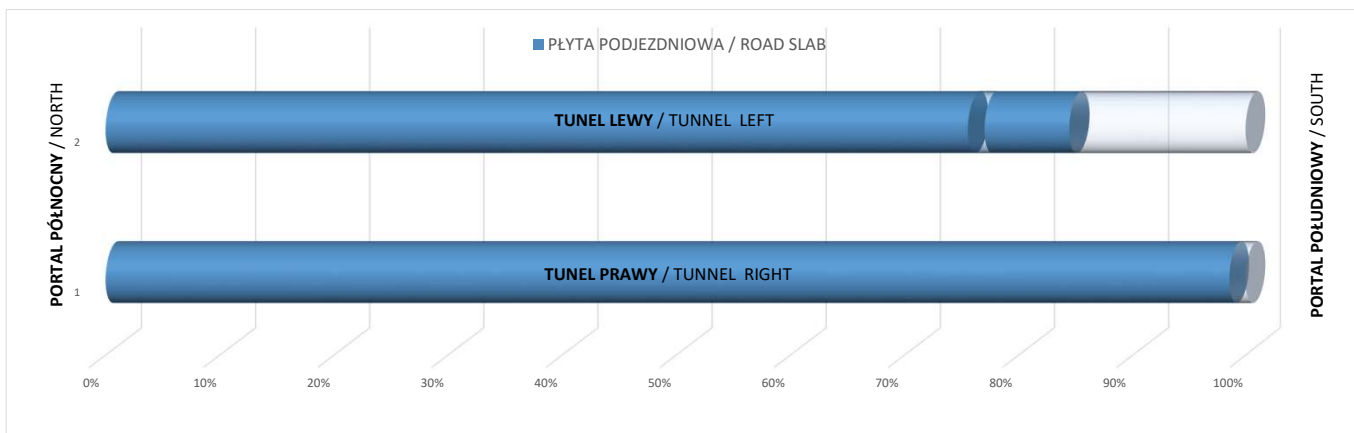

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

3 557,59 [mb]
[lm]

87,0 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

wg osi tunelu / by axis of the tunnel

wykonano / done

start km	721 844,16	2 011,75 [mb] [lm]
end km	723 855,91	98,5 [%]

PŁYTA PODJEZDNIOWA

ROAD SLAB

30,09 [mb]
[lm]
