

## PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

26.09.2021

### TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]	end km	0 [%]
	end km	721 818,46			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	2 059,46 [mb] [lm]
--	-----------------------

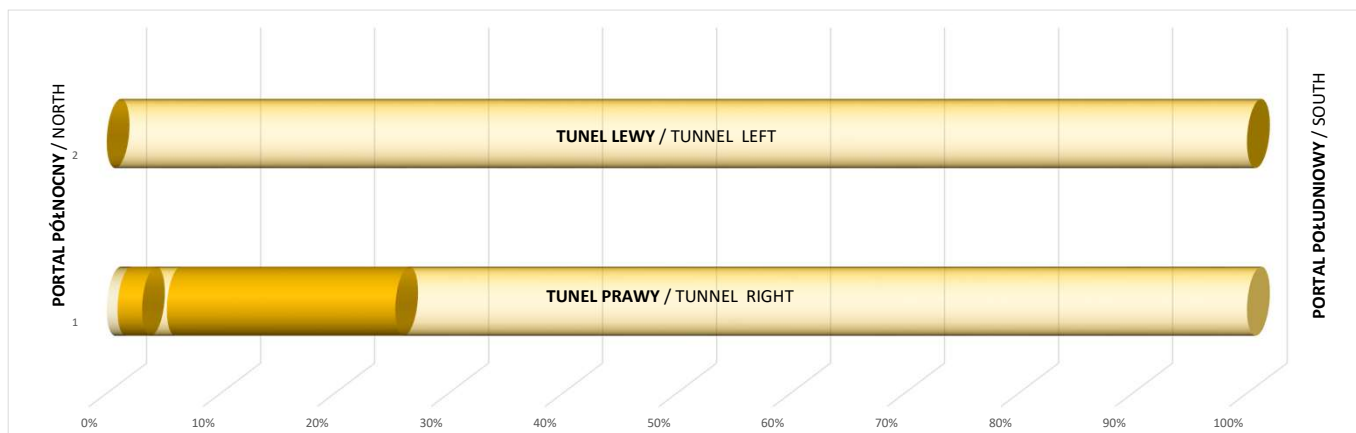

### TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	445,32 [mb] [lm]
	end km	721 906,35	11 [%]

### TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

### POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 863,03	43,32 [mb] [lm]	end km	2 [%]
	end km	721 906,35			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 609,64 [mb] [lm]
--	-----------------------

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 949,85	402,00 [mb] [lm]	end km	20 [%]
	end km	722 387,85			

\*\* NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet  
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb)
