

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

03.10.2021

TUNEL LEWY

TUNNEL LEFT


POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	0,00 [mb] [lm]
	end km	721 818,46	0 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	2 059,46 [mb] [lm]
--	-----------------------

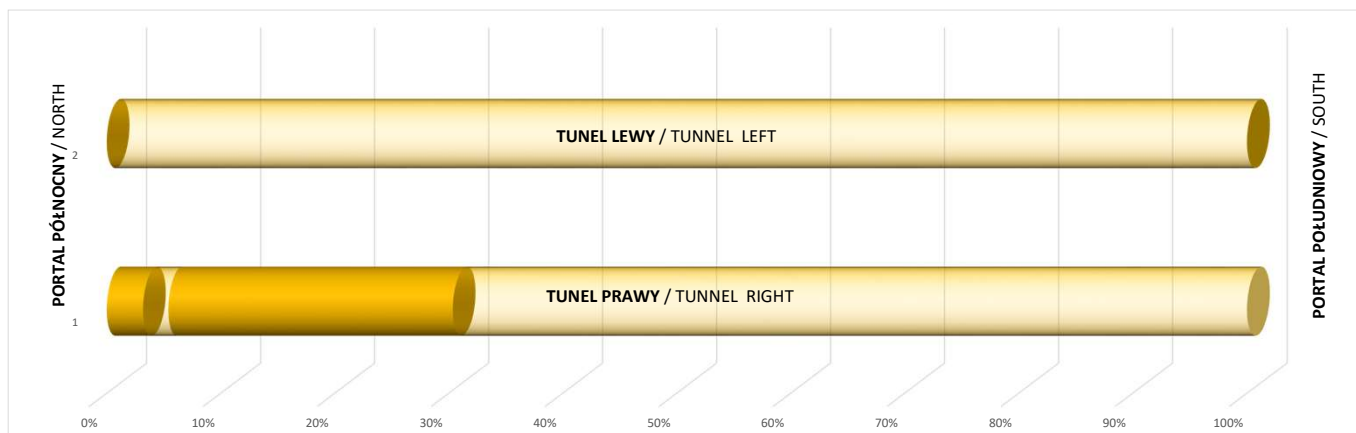

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	550,19 [mb] [lm]
	13 [%]

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16	62,19 [mb] [lm]
	end km	721 906,35	3 [%]

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 504,77 [mb] [lm]
--	-----------------------

wg osi tunelu / by axis of the tunnel wykonano / done

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 949,85	488,00 [mb] [lm]
	end km	722 523,85	24 [%]

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb), 722 423,85 - 722+473,85 (50 mb)
