

PROGRES DLA POWŁOKI OGNIIOCHRONNEJ

PROGRESS FOR FIRE PROTECTION

Progres na dzień:

Progress for day:

14.11.2021

TUNEL LEWY


TUNNEL LEFT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 818,46	116,31 [mb] [lm]	6 [%]	
	end km	721 934,77			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 899,91 [mb] [lm]
--	-----------------------

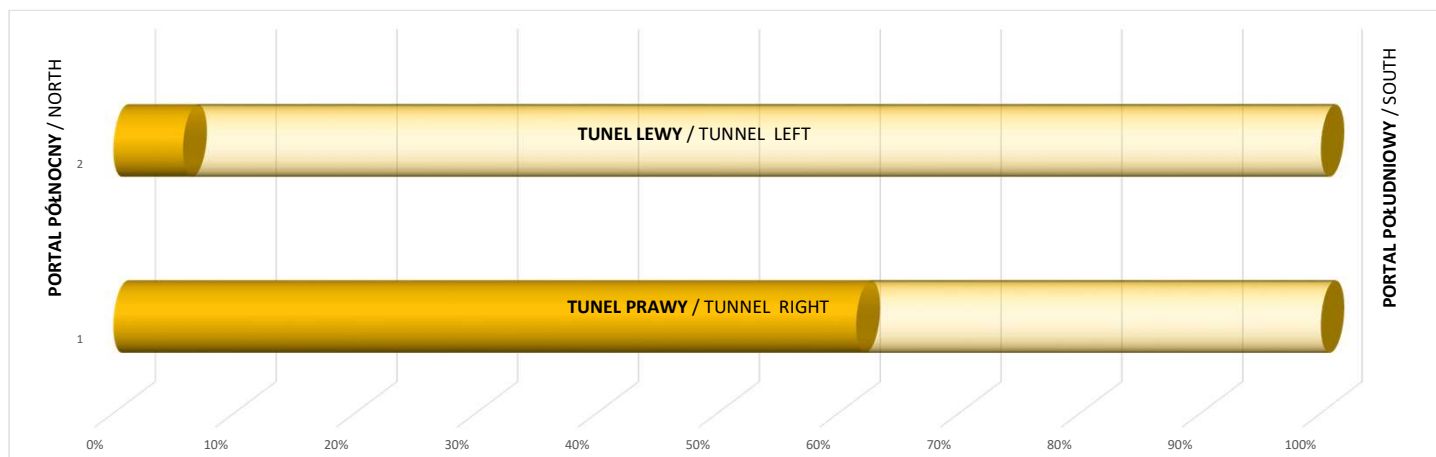

TUNEL LEWY I PRAWY

TUNNEL LEFT AND RIGHT

		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	1 301,55 [mb] [lm]	32 [%]	

TUNEL PRAWY

TUNNEL RIGHT

POZOSTAŁO DO WYKONANIA

TO FINISH

		wg osi tunelu / by axis of the tunnel		wykonano / done	
POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	start km	721 844,16	1 185,24 [mb] [lm]	59 [%]	
	end km	723 113,40			

POWŁOKA OGNIIOCHRONNA FIRE PROTECTION	826,48 [mb] [lm]
--	---------------------

** NIE MA JESZCZE WYKONANEJ POWŁOKI NA ODCINKU / there is no fire protection yet
od km 722 007,85 - 722 019,85 (12 mb), 722 179,85 - 722 191,85 (12 mb), 722 351,85 - 722 363,85 (12 mb), 722 523,85 - 722 535,85 (12 mb),
722 695,85 - 722 707,85 (12 mb), 722 869,40 - 722 881,40 (12 mb), 723 041,40 - 723 053,40 (12 mb)
